[طرح توسعه مخازن] زمانی‌بندی پروژه

[بازرگانی آرادعمران کاسپین]

تاریخ شروع پروژه سرپرستی پروژه	۱۴۰۲/۱۰/۰۱
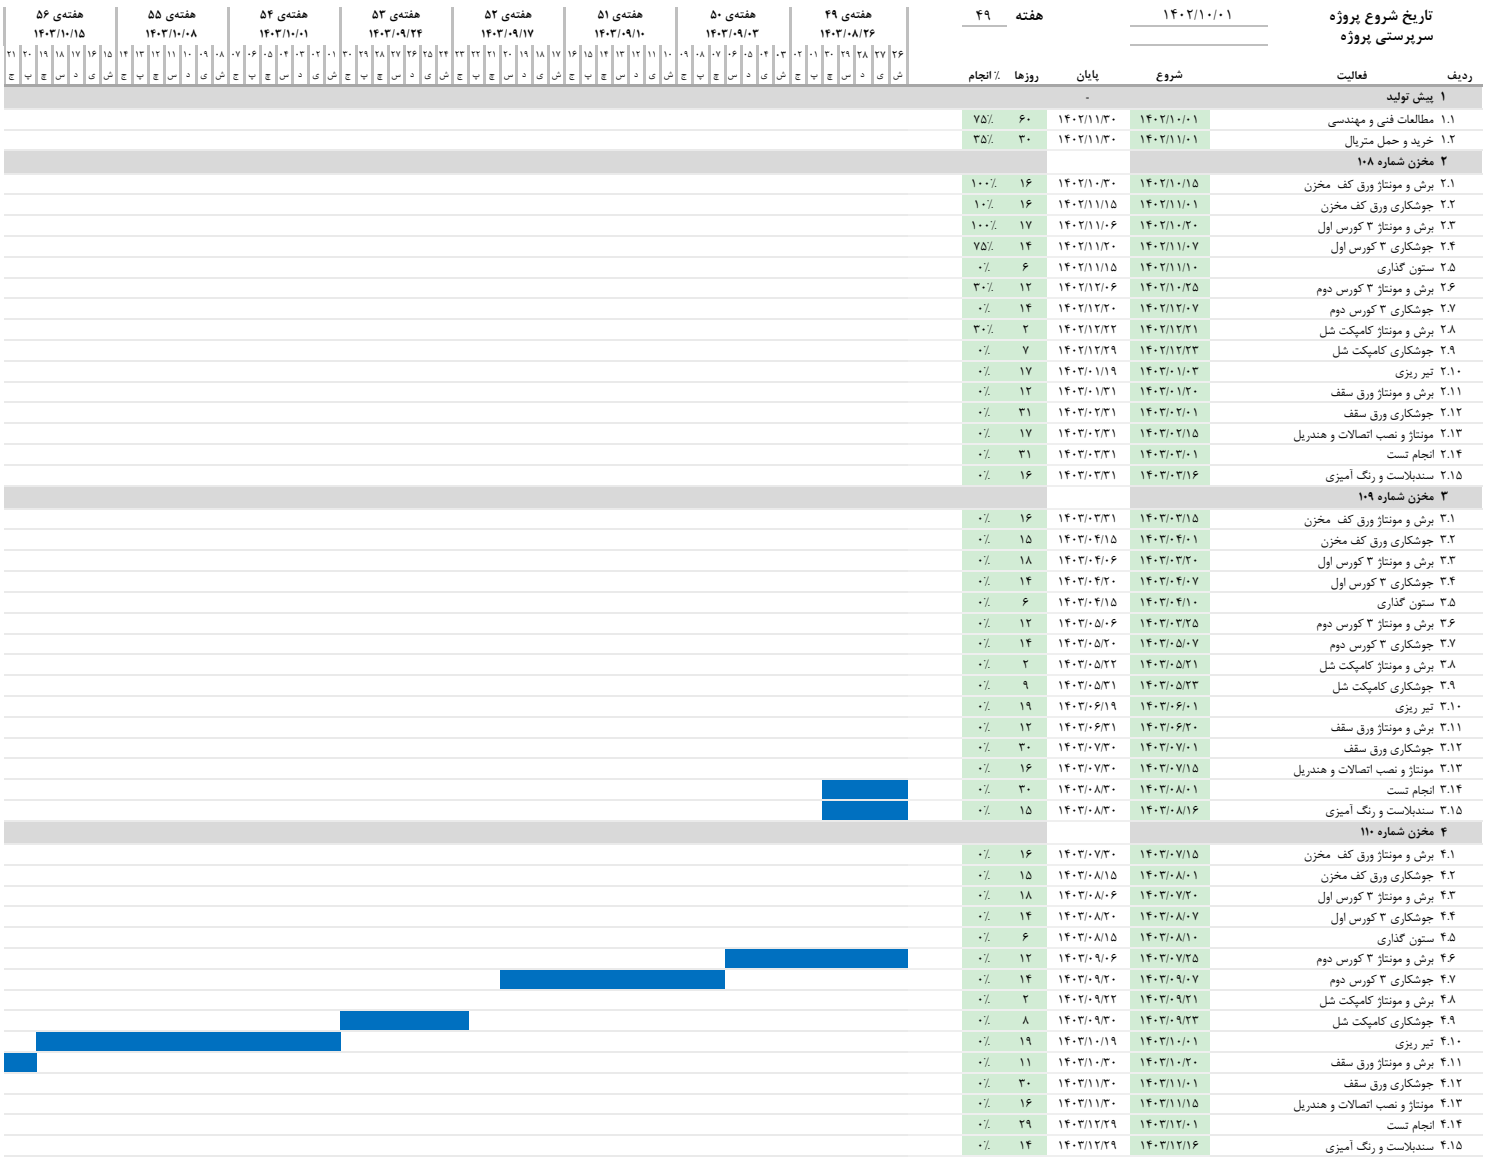
ردیف	فعالیت	شروع	پایان	روزها	% انجام
۱	**پیش تولید**		-		
۱.۱	مطالعات فنی و مهندسی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۰	۷۵٪
۱.۲	خرید و حمل متریال	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۰	۳۵٪
۲	**مخزن شماره ۱۰۸**				
۲.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۱۰۰٪
۲.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۶	۱۰٪
۲.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۷	۱۰۰٪
۲.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴	۷۵٪
۲.۵	ستون گذاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶	۰٪
۲.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۲	۳۰٪
۲.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴	۰٪
۲.۸	برش و مونتاژ کامپکت شل	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲	۳۰٪
۲.۹	جوشکاری کامپکت شل	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۰٪
۲.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۷	۰٪
۲.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲	۰٪
۲.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۱	۰٪
۲.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷	۰٪
۲.۱۴	انجام تست	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱	۰٪
۲.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶	۰٪
۳	**مخزن شماره ۱۰۹**				
۳.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶	۰٪
۳.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۵	۰٪
۳.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۰٪
۳.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴	۰٪
۳.۵	ستون گذاری	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۶	۰٪
۳.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲	۰٪
۳.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴	۰٪
۳.۸	برش و مونتاژ کامپکت شل	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲	۰٪
۳.۹	جوشکاری کامپکت شل	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۹	۰٪
۳.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۹	۰٪
۳.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲	۰٪
۳.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۰	۰٪
۳.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۶	۰٪
۳.۱۴	انجام تست	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰	۰٪
۳.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۵	۰٪
۴	**مخزن شماره ۱۱۰**				
۴.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۶	۰٪
۴.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۵	۰٪
۴.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۸	۰٪
۴.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴	۰٪
۴.۵	ستون گذاری	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶	۰٪
۴.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۲	۰٪
۴.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴	۰٪
۴.۸	برش و مونتاژ کامپکت شل	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲	۰٪
۴.۹	جوشکاری کامپکت شل	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸	۰٪
۴.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۹	۰٪
۴.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱	۰٪
۴.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۰	۰٪
۴.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶	۰٪
۴.۱۴	انجام تست	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۹	۰٪
۴.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴	۰٪
