

مشخصات کلی پروژه

کد پروژه : ST ساختار EPS پروژه : MIS (سیستم اطلاعات مدیریت)

مدیر پروژه : آقای یوسفی


نام پروژه : مکانیزاسیون سیستم انبار

تقویم پروژه : شش روز کاری - جمعه ها تعطیل -


تاریخ شروع پروژه : ۲۰۱۸-۰۱-۰۱

پنجشنبه ها نیم روز کاری

ساختار شکست کار (WBS)

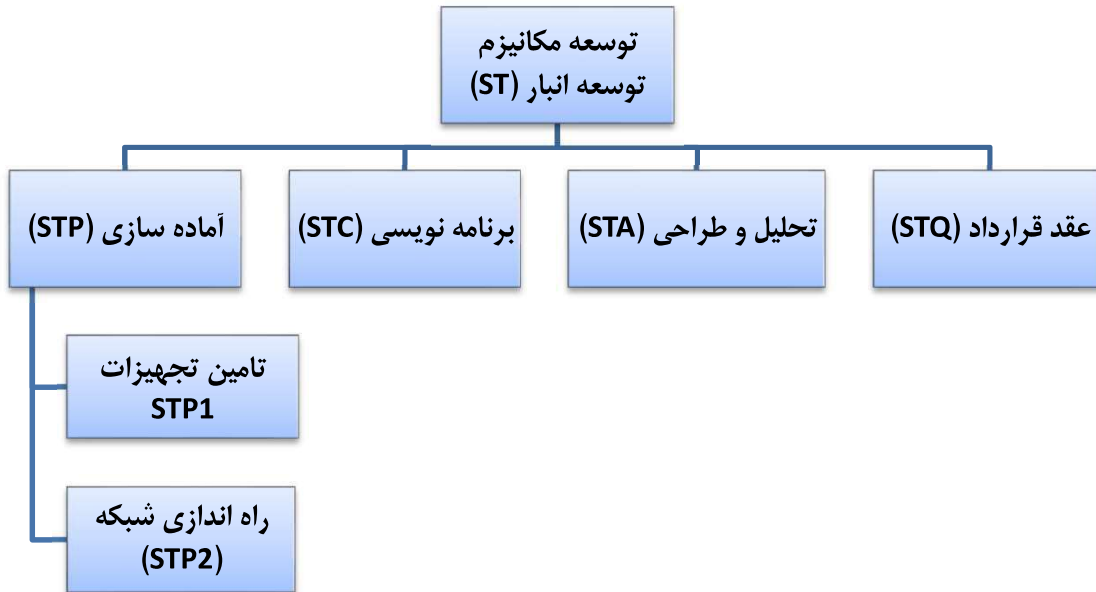

ساختار EPS و OBS

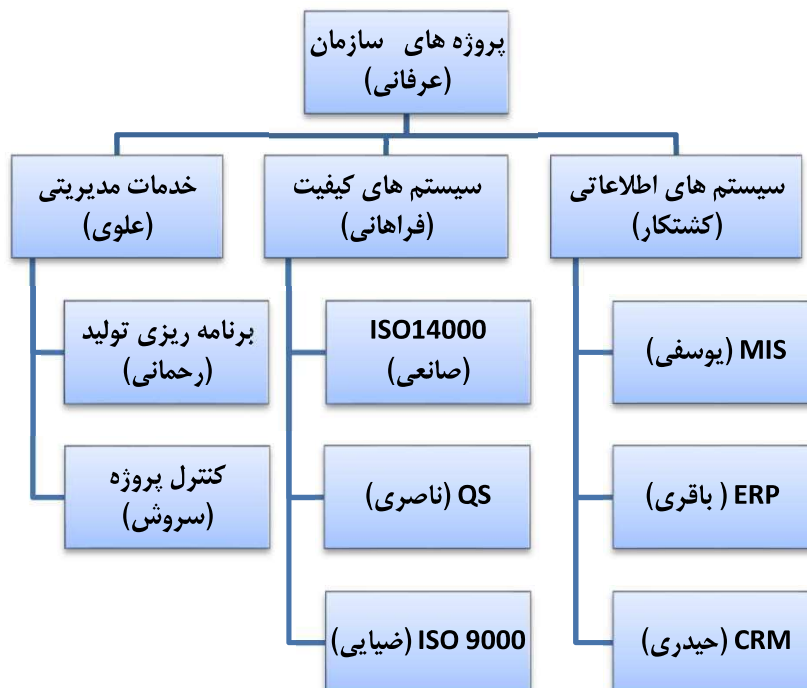

دپارتمان	اسناد مرتبط	تخصیص منابع			Dur.	Pred.	شرح فعالیت	WBS	کد فعالیت
		شماره حساب	مصرف (h/d)	منبع					
-	-	-	-	0	-	شروع	STQ	A90	
سیستم ها	-	C111 C111	5 5	A3 A4	A90	برآورد اولیه هزینه پروژه	STQ	A100	
سیستم ها	شرح خدمات	C111 C111	8 8	A4 A5	A100	تهیه شرح خدمات و مراحل انجام کار	STQ	A110	
سیستم ها	پیش قرارداد	C111 C111	6 6	A3 A4	A110	تهیه پیش قرارداد	STQ	A120	
مدیرعامل	قرارداد	C121 C121	2 1	A1 A2	A120	عقد قرارداد	STQ	A130	
انبار پیمانکار	گزارش وضعیت موجود	C121 C121	7 7	A4 A5	A130	شناخت وضعیت موجود	STA	A140	
سیستم ها	گزارش تحلیل نیازها	C121 C121	5 5	A4 A5	A140	تحلیل نیازها	STA	A150	
سیستم ها	گزارش سیستم پیشنهادی	C121 C121	10 10	A4 A5	A150	ارائه سیستم پیشنهادی	STA	A160	
نرم افزار		C121	3	A7	-	نصب نرم افزارهای پایه	STC	A170	
نرم افزار		C121 C121	8 8	A7 A8	A160 A170	کد کردن برنامه	STC	A180	
سیستم ها		C121	5	A5	A180	تست اولیه برنامه	STC	A190	
نرم افزار		C121 C121	6 6	A7 A8	A190	رفع اشکالات برنامه	STC	A200	
انبار پیمانکار		C121 C121	4 4	A8	A200 A300	نصب دائم برنامه	STC	A210	
انبار پیمانکار		C121	3	A5	A210	آموزش سیستم جدید	STC	A220	
سخت افزار		C121	2	A8	A180	برآورد سخت افزارهای مورد نیاز سیستم	STP1	A230	
مناقصات و خرید		C121	4	A10	A230	تامین تجهیزات	STP1	A240	
انبار پیمانکار		C121	10	A11	A240	نصب و راه اندازی تجهیزات در محیط انبار	STP1	A250	
انبار پیمانکار	نقشه شبکه انبار	C121	5	A6	-	تهیه نقشه اولیه شبکه	STP2	A260	
سخت افزار		C121	2	A6	A260	برآورد تجهیزات مورد نیاز شبکه	STP2	A270	
مناقصات و خرید		C121	2 2	A9 A10	A270	تامین تجهیزات مورد نیاز راه اندازی شبکه	STP2	A280	
انبار پیمانکار		C122 C122 C121 C121	5m 10m 3 3	B11 B12 A6 A8	A250 A280	نصب شبکه محیط	STP2	A290	
انبار پیمانکار		C121	5	A6	A290	تست شبکه و رفع اشکال شبکه	STP2	A300	
				-	A300	پایان	STP2	A310	

نقش‌ها (Roles)

۱- مدیریتی

- ۱-۱- مدیریت عامل
- ۲-۱- مدیریت کل پروژه‌ها
- ۳-۱- مدیریت مالی و اداری
- ۴-۱- مدیریت بازرگانی
- ۵-۱- مدیریت رایانه

۲- کارشناسی

- ۱-۲- کارشناس ISO۹۰۰۰
- ۲-۲- کارشناس ISO۱۴۰۰۰
- ۳-۲- کارشناس QS
- ۴-۲- کارشناس کنترل پروژه

۳- کارمندی

- ۱-۳- کارمند خرید
- ۲-۳- کارمند سفارشات

منابع سازمان (Resources)

گروه منابع A : منابع انسانی

کد منبع	نام منبع	نقش‌ها (Roles)	حداکثر زمان در دسترس (h/d)	قیمت واحد (\$/h)
A1	عرفانی	1-1	10	80
A2	شربت	2-1	12	40
A3	تاجیکفر	3-1	12	35
A4	عیسی زاده	5-1	10	25
A5	باقری	4-2	12	25
A6	میلائی	3-2	8	25
A7	شیخی	2-2	10	25
A8	نجفی	2-1	10	25
A9	حق پرست	1-3	8	25
A10	ظاهری	4-1	8	15
A11	دلیری	2-3	10	15

گروه منابع	زیر گروه منابع	کد منبع	نام منبع	حداکثر در دسترس	قیمت واحد
تجهیزات B	مصرفی B1	B11	کابل شبکه	5000	300
		B12	داکت	1000	200
	غیر مصرفی B2	B21	رایانه	۵۰ ساعت در روز	500
		B22	تستر شبکه	۱۰ ساعت در روز	150

شماره حساب هزینه ها (Cost Account)

